

建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程

委托单位：梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心

编制单位：广东汇嘉源工程管理咨询有限公司

编制日期：2025年4月

编制单位：广东汇嘉源工程管理咨询有限公司

法人代表：张云清

技术负责人：肖金娜

项目负责人：曾志玲

编制人员：张云清、曾志玲

编制单位联系人：肖金娜

电话：0753-2321696

传真：--

地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园 A4 栋第 7 层 702 室

邮编：514700

目 录

前言	1
一、项目总体情况	2
二、验收调查范围、因子、目标、重点	4
三、验收执行标准	6
四、项目工程概况	8
五、环境影响评价回顾	15
六、环境保护措施执行情况	20
七、环境影响调查	22
八、环境质量及污染源监测	25
九、环境管理状况及监测计划	26
十、调查结论与建议	27
附件 1 委托书	30
附件 2 环评批复	31
附件 3 梅州市梅县区发展和改革局、财政局、水务局关于梅县区畚江镇村村通自来水工程 初步设计报告的批复	34
附图 1 项目地理位置图	40
附图 2 平面布置图	41
附图 3 现场情况图	47

前言

畚江镇地处梅县西南部，辖区面积 175 平方公里。随着居民生活水平的提高，个人用水量明显增加，供水工程尚未覆盖的区域亦急切渴望自来水通水，因此原有供水工程已不能满足畚江镇发展的要求。为尽快解决畚江镇居民生活饮用水难题，梅县农村饮水安全项目建设管理中心投资建设“梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程”（下称本项目）。本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。

梅县农村饮水安全项目建设管理中心于 2016 年 10 月委托广东志华环保科技有限公司编制了《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程建设项目环境影响报告表》，并于 2017 年 1 月 13 日取得了梅州市生态环境局梅县分局（原梅州市梅县区环境保护局）《关于梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审〔2017〕10 号）。

经核查，本项目原建设单位为梅县农村饮水安全项目建设管理中心，在项目建设推进过程中，由于为了融资贷款，建设单位发生变更。现建设单位已变更为梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心。

梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程于 2017 年 7 月 3 日开工建设，于 2019 年 3 月 15 日完工。由于资金紧张，项目用于监测以及验收报告编制等方面的资金不足。直到 2024 年底资金到位，才得以全面推进环保验收工作，包括委托专业机构开展全面的环境监测，编制规范的验收报告等，最终于 2025 年具备了组织环保验收的条件。经现场勘察及查阅资料，该工程已完成并具备验收条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）等文件要求，受梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心委托（见附件 1），广东汇嘉源工程管理咨询有限公司承担了该建设项目竣工环境保护验收调查工作。我司接受委托后，立即组织有关人员认真分析其相关资料，进行深入的现场调查，会同相关单位检查环保措施落实和运行情况，并在现场勘察、监测分析和调查的基础上，按照相关技术规范要求，编制完成了《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程建设项目竣工环境保护验收调查表》。

一、项目总体情况

建设项目名称	梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程				
建设单位	梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心				
法人代表	杨志祥	联系人	刘文健		
通信地址	梅州市梅县区文化路8号				
联系电话	19926196010	传真	——	邮编	514000
建设地点	梅州市梅县区畚江镇				
项目性质	新建√ 改建 技改	行业类别	D4610 自来水生产和供应		
环境影响报告表名称	梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程建设项目环境影响报告表				
环境影响评价单位	广东志华环保科技有限公司				
初步设计单位	广州市水务规划勘测设计研究院				
环境影响评价审批部门	梅州市生态环境局梅县分局(原梅州市梅县区环境保护局)	文号	梅县区环审(2017)10号	时间	2017年1月13日
初步设计审批部门	梅州市梅县区发展和改革委员会、梅州市梅县区财政局、梅州市梅县区水务局	文号	梅县区发改审(2016)148号	时间	2016年9月29日
工程施工单位	广东钧意建筑集团有限公司				
验收监测单位	——				
投资总概算(万元)	1431.74	其中:环境保护投资(万元)	10	实际环境保护投资占总投资比例	0.7%
实际总投资(万元)	1023.19	其中:环境保护投资(万元)	8		0.78%
设计生产能力	/	建设项目开工日期		2017年7月3日	
实际生产能力	/	完工日期		2019年3月15日	

<p>项目建设过程 简述（项目立 项～试运行）</p>	<p>1、环境影响评价文件审批时间</p> <p>梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心于 2016 年 10 月委托广东志华环保科技有限公司编制了《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表》，并于 2017 年 1 月 13 日取得了梅州市生态环境局梅县区分局（原梅州市梅县区环境保护局）《关于梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审〔2017〕10 号），详见附件 2。</p> <p>2、项目设计审批情况</p> <p>“梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程”于 2016 年 9 月 29 日取得了由梅州市梅县区发展和改革局、梅州市梅县区财政局、梅州市梅县区水务局审批《梅州市梅县区发展和改革局、财政局、水务局关于梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告的批复》（梅县区发改审〔2016〕148 号），详见附件 3。</p> <p>3、项目建设过程</p> <p>本工程于 2017 年 7 月 3 日开工建设，于 2019 年 3 月 15 日完工。</p>
-------------------------------------	---

二、验收调查范围、因子、目标、重点

调查范围	<p>本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。</p>
调查因子	<p>生态环境、固废环境：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 固废环境：施工期生活垃圾等处置情况；(2) 生态环境：工程占地、植被、陆生生物及水生生物等。

本项目周边主要环境敏感目标见表 2-1。

表 2-1 环境敏感目标情况

环境要素	保护目标	距离	方位	规模	保护级别
大气环境 声环境	项目沿线居民	约 20~200 米	项目 沿线	约 500 户	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级 标准 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类 标准
水环境	梅江水	10 米	项目 沿线	——	《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002) 的 II 类标准

环境敏感目标

根据工程建设项目环境影响、污染的特征，本次调查的重点是工程建设造成的生态环境影响、声环境影响、环境空气影响及水环境影响，环境影响报告表及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

调查重点

- 1、调查实际工程内容及方案的变更情况。
- 2、重要生态保护区和环境敏感目标。
- 3、调查环境影响报告表及其批复中提出的主要环境影响。
- 4、环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果等。
- 5、配套环境保护设施的运行情况及治理效果。
- 6、调查实际工程“三同时”执行情况。
- 7、工程环境保护投资情况。

三、验收执行标准

环境质量标准	1、大气环境质量标准					
	本项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中二级标准。具体标准值见下表。					
	表 3-1 环境空气质量标准					
	污染物项目	平均时间	单位	浓度限值	标准来源	
	SO ₂	年平均	μg/m ³	60	(GB3095-2012)及其 2018 年修改单中的二级标准	
		24 小时平均		150		
		1 小时平均		500		
	NO ₂	年平均		40		
		24 小时平均		80		
		1 小时平均		200		
O ₃	日最大 8 小时平均	160				
	1 小时平均	200				
PM ₁₀	年平均	70				
	24 小时平均	150				
PM _{2.5}	年平均	35				
	24 小时平均	75				
CO	24 小时平均	mg/m ³	4			
	1 小时平均		10			
TSP	年平均	μg/m ³	200			
	24 小时平均		300			
2、地表水环境质量标准						
项目地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，具体见下表。						
表 3-2 地表水环境质量标准（pH 无量纲）						
项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	DO	氨氮	总磷
浓度（mg/L）	6-9	≤15	≤3	≥6	≤0.5	≤0.025
项目	悬浮物	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群	石油类	/	/
浓度（mg/L）	/	≤0.2	≤2000	≤0.05	/	/
3、声环境质量标准						
项目附近声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，具体标准值见下表。						
表 3-3 声环境质量标准						
声环境功能区类别	昼间 dB（A）	夜间 dB（A）				
2 类	60	50				

<p>污 染 物 排 放 标 准</p>	<p>本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。</p>
<p>总 量 控 制 指 标</p>	<p>本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生，故不设置总量指标。</p>

四、项目工程概况

项目名称	梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程
项目地理位置	梅州市梅州市梅县区畚江镇 (详见附图 1)

工程内容及规模:

为尽快解决畚江镇居民生活饮用水难题，梅县农村饮水安全项目建设管理中心投资建设“梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程”（下称本项目）。本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。

实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因:

1、工程建设内容

经调查，与环评阶段工程组成情况对比，项目实际建设情况一览表见下表:

表 4-1 项目实际建设情况一览表

项目	工程名称	环评内容	实际建设内容	与环评是否一致
	主体工程	共敷设输配水管网 103706m，其中，畚江工业园区自来水厂扩网供水咸和村、松林村、杉里村和双溪村 4 个村，管网总长度 32324m；畚江农饮自来水厂扩网供水新化、中坑、双螺、太湖等 7 村，管网总长度 39164m；径心村新建引水陂 1 座，供水站 1 座，输配水管网 12400m；叶华村新增输配水管网 10600m。	共敷设输配水管网 116364m，其中，畚江工业园区自来水厂扩网供水咸和村、松林村、杉里村和双溪村 4 个村，新建引水陂 1 座，管网总长度 44052m；畚江农饮自来水厂扩网供水新化、中坑、双螺、太湖等 7 村，修复引水陂 1 座，管网总长度 50365m；径心村新建引水陂 1 座，不锈钢过滤器 2 套，输配水管网 7147m；叶华村新建引水陂 1 座，输配水管网 14800m。	输配水管网较环评增加 12658m，增加 3 座引水陂建设。

环保工程	废气	执行广东省地方标准《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。	本项目建设内容主要为敷设输配水管网116364m,解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建设后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。	本项目建设内容主要为敷设输配水管网116364m,解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建设后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。
	废水	本项目生活污水经三级化粪池处理达农灌标准后用于厂区绿化、附近林灌,执行国家标准《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)。		
	噪声	运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。		
	固废	员工生活垃圾交由环卫部门处理;处理剂包装袋收集后交由供应厂家回收处理。		

2、是否重大变动

本项目的性质、规模、地点、工艺流程和环境保护措施五个因素均未发生重大变动,与环境影响报告表基本一致,不会使污染物增加,故项目不属于重大变更,不需要重新报批建设项目环境影响报告表。

本项目建设内容与环评及批复建设内容一览表见下表:

表 4-2 本项目与重大变动清单对照表

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告表
项目性质	新建	新建	无	否	否
规模	共敷设输配水管网103706m	共敷设输配水管网116364m	输配水管网较环评增加12658m	否	否
项目投资	总投资1431.74万元,其中环保投资10万元,占总投资0.7%	总投资1023.19万元,其中环保投资8万元,占总投资0.78%	总投资1023.19万元,其中环保投资8万元,占总投资0.78%	否	否
工艺流程	施工放线、管沟开挖、管道铺设、回填土方、路面恢复、试压生产等	施工放线、管沟开挖、管道铺设、回填土方、路面恢复、试压生产等	无	否	否
环保工程	本项目运行过程中无明显的大气污染物产生	本项目建设内容主要为敷设输配水管	本项目建设内容主要为敷设输配	否	否

	生。	网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。	水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。		
	本项目运行过程中无明显的水污染物产生。			否	否
	运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。			否	否
	本项目运行过程中无固体废物产生。			否	否

施工期工艺流程

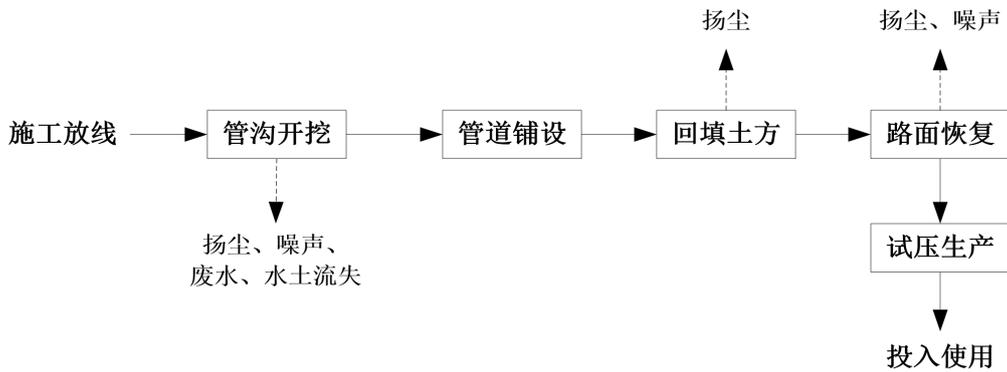


图 4-1 工艺流程图

工程说明：

- 1) 根据设计方案在实地进行施工放线，确定施工的管线位置；
- 2) 为减少交通影响以及减少对现状道路的破坏开挖过程采用双侧钢板桩、支护挂网喷浆等支护措施；
- 3) 为消除地震液化沉陷对管道的影 响，采用水泥搅拌桩、振冲置换法及振冲密实法消除其影响；
- 4) 回填管道敷设后立即进行沟槽回填，沟槽回填从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行，并确保管道和构筑物不产生位移必要时宜采取临时限位措施，防止上浮。

工程占地及平面布置

根据本工程特点，施工总布置主要依据以下原则进行：

- 1) 充分适应工程施工特点：与枢纽类工程的集中施工不同，工程线路长，分布广，建筑物种类多和分散。因此，施工布置应有利于充分发挥施工设施的生产能力，满足进度要求及质量要求，并结合场内外道路，按“有利于生产，方便生活，易于管理，安全可靠，经济合理”的原则进行分段、分片布置。
- 2) 施工总布置设计，应紧凑合理，节约用地，并尽量利用荒地、滩地、坡地不占或少占良田。
- 3) 施工场内交通规划，必须满足工程施工需要，适应施工程序、工艺流程；全面协调单项工程、施工企业、地区间交通运输的连接与配合；力求使交通联系简便，运输组织合理，节省线路和设施的工程投资，减少管理运营费用。

4) 施工临时设施和永久性设施, 应考虑相互结合, 统一规划的可能性。其中包括施工便道道路、生产生活房屋及供水排水设施等。应尽量建成永久性设施为施工期使用, 以减少临建费用。

5) 为减少新增水土流失必须做好土石方量平衡设计, 在不影响防洪情况下, 尽量将开挖料综合利用, 做好水土保持方案, 尽量减少或避免弃渣。

本工程根据现场施工条件和施工项目分布、现场地形地貌, 以及施工总布置的规划原则, 对工程进行建设。本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m, 解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。主要外来材料、设备和生活物资等的对外交通运输均采用公路运输方式, 施工生活区就近租用民房。施工期结束后已对施工迹地进行了恢复。

工程环境保护投资明细

本工程实际总投资 1023.19 万元, 实际环保投资 8 万元, 占工程总投资的 0.78%。

表 4-3 项目主要环保投资明细表

类别		环保措施		实际环保投资 (万元)
施 工 期	生态保护	水土保持措施	工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、水土保持功能补偿费用等	2
	环境空气	废气防治	施工洒水抑尘、防尘网等	2
	水环境	废水防治	施工场地设置沉淀池、沉砂池等废水处理设施	2
	声环境	噪声防治	低噪声设备、施工机械保养、隔声屏障(围挡)	1
	固体废物	生活垃圾等	生活垃圾交由环卫部门定期清理	1
合计				8

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

一、施工期

1、施工期废水排放及治理措施

本项目工作人员食宿均依托周边生活设施，项目范围内不产生生活污水，项目施工期产生的废水主要为施工废水。

施工废水：施工废水主要为机械设备运转的冷却水和车辆及机械设备的冲洗废水、作业面冲洗废水等废水。施工废水集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理，处理后的废水回用于再次机械冲洗，不外排。

据调查，施工期未收到施工废水污染投诉。

1、施工期废气排放及治理措施

本项目施工期产生的废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，建设单位在施工阶段采取以下防护措施：

①对施工场地应经常洒水，防止扬尘；开挖、钻孔和拆迁过程中应洒水，以使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬污染周围空气环境。

②加强交通运输管理，运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装卸前先冲洗干净，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。

③运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘。

据调查，施工期未收到施工废气污染投诉。

2、施工期噪声排放及治理措施

施工期噪声来源于施工机械设备的运转及交通运输。本项目选用低噪声设备、减低设备运行噪声、合理安排噪声污染严重的设备的施工时间、暂不使用的设备立即关停等措施降噪，对周围环境的影响不大。据调查，施工期未收到施工噪声污染投诉。

3、施工期固体废物排放及治理措施

根据《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程建设项目环境影响报告表》，环评报告中施工期固体废物包括生活垃圾及工程弃土。

根据现场调查及访问，本项目施工期间建筑工地实际产生的固体废物为生活垃圾，无工程弃土。本项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门转运处理。本项目施工过程中所产生的固体废物不会直接向环境排放，且随着施工期的结束，这种影响也随之结束，不会对周围环境产生

明显影响。据调查，施工期未收到固体废物污染投诉。

4、施工期生态环境保护措施

项目不涉及新增占地，施工时破坏的项目所在地及周边土壤结构通过施工结束后采取的植树种草等措施恢复原有面貌；工程施工临时场地布置和作业带占用和破坏一定面积的陆生植被通过工程完工清理及人工补植后自然恢复；施工期对底栖动物及陆生动物的影响通过工程结束后消失；施工单位在施工期做好项目所在区域水土保持措施。采取以上措施后对施工对项目所在区域的生态环境影响不大。据调查，施工期未收到生态环境污染投诉。

二、运营期

本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水，现场不设驻点办公人员，由管理部门派巡视人员管理，无生活污水排放和生活垃圾排放，对周围环境无影响。

五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（水环境、大气环境、声环境、固体废物和生态环境等）

一、结论

1、项目概况

本供水项目重点解决畚江镇 13 条村现状共计 19268 人的饮水问题。设计基准年为 2014 年，水平年为 2029 年，设计年限 15 年，设计年限内人口自然增长率取 3%，设计水平年供水区人口 20039 人。本项目建设内容主要为：敷设输配水管网长约 103706m；新建进水池 2 座，蓄水池 1 座。该项目实施后可解决当地农村人口饮水安全问题，满足农民对水量和水质的要求，进一步促进当地经济可持续发展。项目预计 2017 年 7 月投入使用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等相关法律法规的有关要求，该项目必须办理环境影响评价相关手续，编制环境影响报告表。为此，梅州市梅县区畚江镇人民政府委托广东志华环保科技有限公司承担本项目的环评工作。

2、环境质量现状情况

2.1 大气环境质量现状

项目周围沿线环境空气主要污染物均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值要求。

2.2 地表水环境质量现状

监测结果表明：项目管线沿线附近梅江河及小溪各监测因子的标准指数值均<1，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II 类水质的标准要求。

2.3 声环境质量现状

项目沿线敏感点昼间和夜间声环境监测值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)的要求，区域声环境现状质量较好。

3、施工期环境影响分析及采取的治理措施

施工期主要污染源为废气、噪声、施工人员的生活污水、生产废水及固体废物。

(1)施工期水环境影响分析及采取的治理措施

施工人员生活污水通过三级化粪池处理后供应给附近的农田灌溉，不外排，对环境影响较小。

本工程施工废水以悬浮物污染为主，且悬浮物主要是大颗粒不溶性的无机物颗粒，经一定时间沉降，悬浮物可以得到去除，废水可以作为场地降尘洒水使用。

工程施工期机械设备冲洗废水主要污染物为 SS 以及少量的石油类。采用“隔油沉淀池+防护池(用于二级沉淀和回用水的储存池)”处理后回用于车辆冲洗及道路洒水抑尘，对环境无影响。

试压清管废水以 SS 为主要污染特征，经长期静置沉淀后外排，对地表水体水质影响不大。

项目施工期对地下水的影响主要表现在地下水降水影响上。因项目大部分管道施工地区的地下水水位较深，故在管道施工不影响地下水位。

(2)施工期大气环境影响分析及采取的治理措施

施工过程中扬尘会造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。项目采用洒水抑尘的方法减少扬尘的产生。

道路施工机械排放的污染物主要有 CO、NO₂、THC。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但项目周边大气扩散能力较强，故施工过程中施工机械废气很快能得到扩散，不会对区域环境空气质量造成太大的不利影响。

(3)噪声环境影响分析及采取的治理措施

施工期噪声主要来自施工机械设备运行产生的噪声。噪声级一般在 79~90dB(A)。噪声采取合理安排施工时间，控制噪声源强，控制噪声传播，加强管理等措施。

(4)固体废物影响分析及采取的治理措施

项目施工期固体废物主要包括工程弃土和施工人员生活垃圾。

本工程开挖的土方一部分用于管沟回填，弃土运至指定的弃土场。

生活垃圾由城区环卫站统一收集处理。

(5)水土流失影响分析及采取的治理措施

由于管网工程主要位于建成区域，在施工过程中只要加强管理，因管网施工带来的水土流失就会大大减小，但施工时需使弃渣临时堆放点与河道保持一定距离，避免弃渣流入河道，另外建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。管道开挖建设中，应尽量

避开雨季。

4、项目运营期环境影响分析及采取的治理措施

(1) 运营期水环境影响分析及采取的治理措施

本工程运行期产生的污水主要为厂区管理人员生活污水。

水厂管理区生活污水，经隔油池和化粪池处理后排入沟渠用于农田灌溉，对周边水体影响很小。

(2) 运营期大气环境影响分析及采取的治理措施

本项目在运营过程中不产生废气，故不会对大气环境产生不良影响。

(3) 运营期噪声环境影响分析及采取的治理措施

本项目在正常运行的情况下，加压泵房的水泵运行会产生噪声，噪声源强约为 85dB(A)，水泵位于加压泵房，并采取基础减振，不会对环境造成不良影响。

(4) 运营期固体废物影响分析及采取的治理措施

本项目拟招 20 名管理员，在运营期主要的固体废物为管理人员产生的生活垃圾及污泥，在水厂设置垃圾堆放设施，专人及时清理，按类别分别进行回收，集中后外运至当地垃圾场处理，严禁乱弃垃圾，运营期产生的污泥压干后填埋；运行设备维护产生的废料交由有资质的单位回收处理。固体废物经过上述措施后不会对环境造成不良影响。

5、总量控制指标

本项目不设总量控制指标。

二、对策建议

本项目属于管网建设工程，为减少项目建设和营运对周围环境的影响，项目建设和营运过程应做好以下几方面的工作：

1、施工单位应根据评价提出的环保治理措施情况，落实废水治理措施和施工扬尘控制措施，减轻施工废水和废气对环境的不利影响；

2、通过加强管理，减轻施工设备噪声对环境造成太大的不利影响；

3、按照当地的建筑弃土管理规定，对施工弃土弃渣采取安全处置措施；

4、水土保持措施应作为本工程的组成部分，列入项目总体设计，为主体工程服务；水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工验收时，必须同时接受水土保持行政主管部门验收水土保持工程。

三、结论

综合本报告的环境现状监测、工程污染分析、环境影响分析的结果，本报告认为：梅县区村村通自来水工程-畚江镇的实施虽然会对沿线环境造成一定的影响，但在采取一定的环境措施后可有效降低此影响，保证沿线环境质量不会发生较大变化。而本工程实施后，有利于改善该区的饮用水安全。因此，本评价认为，只要项目实施单位严格按照本报告提出的建议，落实相关的环保措施要求，最大程度降低项目实施过程中产生的不良环境影响，从环境保护角度来说，该项目的实施是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心已于2017年1月13日取得了梅州市生态环境局梅县分局（原梅州市梅县区环境保护局）的审批文件：《关于梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审〔2017〕10号），原文如下：

一、项目位于梅县区畚江镇的松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村。项目主要建设内容为敷设输配水管网103706米，新建进水池2座，蓄水池1座。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

三、项目应重点做好如下环境保护工作：

（一）施工期间应严格控制周围水体产生石油类污染现象的发生。施工废水经处理后回用于场地抑尘，生活废水依托当地农村污水处理设施处理达标后回用于农田灌溉。废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作物标准。

（二）加强对施工场地、堆场、运输车辆的管理，尽量减轻无组织扬尘对周围环境的影响。废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/47-2001）第二时段二级标准。

（三）合理布局施工机械，安排好作业时间，通过选用低噪声设备、设置隔声屏障等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实固体废弃物的综合利用和处理处置措施，设置规范的废渣储存设施，防治造成二次污染。余泥渣土、建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场处理；施工人员生活垃圾应集中堆放，交由环卫部门处理。维护过程中产生的废料交有资质单位回收处理。

（五）加强生态环境保护，落实水土流失防治措施。

四、项目环保投资应纳入工程投资预算并予以落实。

五、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，你单位应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我局申请项目竣工环境保护验收。

批复意见原件见附件。

六、环境保护措施执行情况

阶段	项目	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
施工期	废气	施工废气经采取施工工地边界用挡网、围幕布将工地与外界隔绝起来、洒水抑尘、加强交通运输管理等措施，对周围环境影响不大。	施工废气经采取施工工地边界用挡网、围幕布将工地与外界隔绝起来、洒水抑尘、加强交通运输管理等措施，对周围环境影响不大。	已按要求执行
	废水	本项目工作人员食宿均依托周边生活设施，项目范围内不产生生活污水，项目施工期产生的废水主要为施工废水。施工废水经集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理，达到要求后回用于再次机械冲洗，不外排，不会对周围环境造成任何不利影响。	施工废水经集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理，达到要求后回用于再次机械冲洗，不外排，不会对周围环境造成任何不利影响。	已按要求执行
	噪声	施工期噪声来自各类施工设备和运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，大多为不连续噪声，主要设备噪声和机械噪声。通过合理安排施工时间、使用低噪声设备、设备减震等降噪措施来减少噪声对环境的影响，采取以上措施后噪声对环境影响很小。	项目实施过程中产生的噪声通过合理安排施工时间、使用低噪声设备、设备减震等降噪措施来减少噪声对环境的影响。	已按要求执行

阶段	项目	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
	固体废物	<p>施工期固体废物包括生活垃圾、工程弃土。</p> <p>本工程开挖的土方一部分用于管沟回填，弃土运至指定的弃土场；施工人员生活垃圾应集中堆放，交由环卫部门处理。</p>	<p>据现场调查及访问，施工期固体废物实际产生的主要有生活垃圾，无工程弃土。</p> <p>生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。</p>	已按要求执行
其他	总量控制	<p>本项目建成后无废水、废气及固体废弃物产生，无总量控制指标。</p>	<p>本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生，无总量控制指标。</p>	已按要求执行
	环评报告表批复中的要求	<p>项目必须严格按照申报的内容和规模进行实施。若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的处理工艺或防止污染的措施发生重大变动，必须重新报批环评文件。</p>	<p>项目实际建设工程规模按规划设计方案实施建设，与环评报告及批复文件要求相比，工程投资及工程量在建设中根据实际情况有所调整，但是以上变更内容不属于重大变更。</p>	已按要求执行
		<p>建设项目竣工后，必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的标准和程序，进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开。</p>	<p>该工程委托广东汇嘉源工程管理咨询有限公司编制竣工验收调查报告表，并依法向社会公开。</p>	已按要求执行

七、环境影响调查

施 工 期	生态 影响	<p>施工期生态环境的影响主要是土地利用、施工区域内植被破坏、水域、陆域动物的扰动,但这种影响是短暂的,施工期已进行了相应的保护措施,现施工期已结束,项目临时占地已按原貌进行恢复和绿化,施工期生态环境影响已逐渐消失。</p> <p>①对土地利用的影响:本项目施工期结束后已对施工迹地进行了恢复,本工程建设不会改变原有的土地利用性质,因此,对区域土地利用类型影响很小。</p> <p>②对水土流失的影响:施工期定期洒水降尘,开挖土方及时回填,进行土地平整,并对裸露土地进行表面植被培养,尽可能地恢复原有地貌,加强绿化、合理种植,因此本项目未造成严重水土流失现象。</p> <p>③对区域景观的影响:工程施工期间对景观环境的影响主要为填挖作业及临时施工区占地对植被、地形地貌的影响。本项目施工已结束,临时占地已进行复垦和植被恢复,临时占地区域已基本恢复原有景观,未对区域景观造成不良影响。</p> <p>④对植被环境的影响:施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏对土壤物理结构和化学成分发生改变,不利于植物的生长和植被恢复,因此,应尽量维护土壤现状,以有利于植被重建和生态恢复工作。</p> <p>⑤对陆生生态的影响:由于施工影响区内无国家保护名录内的鸟类和野生动物,加之施工结束后施工噪声随之结束,工程影响区内的鸟类和野生动物能够迅速恢复,因此工程施工对周围生态环境影响甚小。建设区域除农业生态和家畜、家禽之外,自然生态物种不多。基本上不存在对陆生野生动物的影响。</p> <p>⑥对水生生态的影响:粉尘对底栖动物的摄食和繁殖有一定影响,以尽量减少对水质的破坏,保护底栖动物和其他生物的生存环境。</p> <p>项目的建设对水利条件改变不大,施工水域水体没有鱼类产卵场。本工程涉及的区域内没有国家级和省级的水域自然保护区,也没有具有保护价值水生生物。因此,工程建设对水生生态的影响较小。</p>
-------------	----------	---

	<p style="text-align: center;">1、废水</p> <p>施工期：本项目工作人员食宿均依托周边生活设施，项目范围内不产生生活污水，项目施工期产生的废水主要为施工废水。施工废水经集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理后回用于再次机械冲洗，不外排，不会对周围环境造成任何不利影响。据调查，施工期未收到施工废水污染投诉。</p> <p>运营期：本工程建成后无废水排放，不会对周围环境造成任何不利影响。</p> <p style="text-align: center;">2、废气</p> <p>本项目施工期产生的废气主要是施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘等。施工机械及运输车辆排放尾气产生量较小，对周围环境影响不大；施工扬尘采取洒水防尘措施，对大气环境影响范围比较小。据调查，施工期未收到施工废气污染投诉。</p> <p style="text-align: center;">3、噪声</p> <p>施工期噪声来自各类施工设备和运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，大多为不连续噪声，主要设备噪声和机械噪声。通过合理安排施工时间、使用低噪声设备、设备减震等降噪措施来减少噪声对环境的影响，采取以上措施后噪声对环境的影响很小。据调查，施工期未收到施工噪声污染投诉。</p> <p style="text-align: center;">4、固体废弃物</p> <p>据现场调查及访问，施工期固体废物实际产生的主要有生活垃圾，无工程弃土。</p> <p>生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。</p> <p>据调查，施工期未收到施工固体废物污染投诉。</p>	<p style="text-align: center;">污染 影响</p>
	<p style="text-align: center;">社会 影响</p>	<p>根据调查了解，在项目施工过程中，未发生过环保投诉及环境污染纠纷。</p>

运 行 期	生态 影响	<p>本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。本工程生态环境影响主要是建设期的影响。</p> <p>本工程属于短期的临时性占地，而且施工地段多为建成区，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。施工过程中将有部分挖方和填方工程，造成裸露，杂乱和凌乱。在雨季的气候条件下还会产生水土流失，这些将对景观环境都会造成一定的破坏。项目通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，能最大限度地降低项目建设对生态环境的影响。</p>
	污染 影响	<p>本工程建成后，现场不设驻点办公人员，由管理部门派巡视人员管理，无生活污水排放和生活垃圾排放。</p>
	社会 影响	<p>本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后解决了石坑镇全镇居民生活饮用水难题，居民生活用水得到了基本保证。</p>

八、环境质量及污染源监测

本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。

九、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）

1、施工期

项目施工期间的环境管理监控主要由工程监理单位执行，未专门设置环境监理。

监理单位设有专职人员，根据施工方案、环评报告及环评批复中要求，对项目施工过程进行环境管理。监理的重点主要包括污水、扬尘、噪声、固体废物及生态保护等问题。对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工，并对毁坏的植被进行恢复，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中。

2、运营期

运营期的环境管理由建设单位设置兼职环保管理人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。

环境监测能力建设情况

项目运营单位不具备环境监测能力，环境监测任务主要委托具备环境监测资质的第三方检测机构完成，以及当地环保部门进行例行检查或监测。

环境影响报告中提出的监测计划及其落实情况

本项目环境影响报告中无运营期环境监测计划，运营期正常情况下不会对周边环境产生影响，无需进行日常环境监测。项目不设置专门的环境管理监测机构。在事故状态下，委托有资质单位进行事故监测。

环境管理状况分析与建议

根据走访调查，整个施工期中未发生大的环境污染事故，对环境的影响也经采取的环保措施得到了较大的削减，未对周围环境造成不良影响，施工期的环境管理措施是有效的。

工程施工期的环境管理，施工期制定有详细的操作规范，能够有效地保证该工程采用的环保措施基本能够落实到位。总的说来，该工程环境管理机构及制度基本可行。

十、调查结论与建议

调查结论及建议

本次环境保护竣工验收调查对工程所采取的环境保护措施进行了详细调查，根据工程现状判定措施的落实情况，结合环境管理状况，从环境保护角度对本项目提出如下调查结论和建议：

（一）工程概况

为尽快解决畚江镇居民生活饮用水难题，梅县农村饮水安全项目建设管理中心投资建设“梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程”（下称本项目）。本项目建设内容主要为敷设输配水管网 116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。

本工程于 2017 年 7 月 3 日开工建设，于 2019 年 3 月 15 日完工。

（二）环保工作执行情况

该项目于 2017 年 1 月 13 日取得了梅州市生态环境局梅县分局（原梅州市梅县区环境保护局）《关于梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审（2017）10 号）。项目的建设基本执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，各项环保措施符合设计要求，落实了建设项目环境影响评价报告表及其批复的要求。环保审查、审批手续完备。

（三）生态环境影响结论

本项目施工期生态环境的影响主要是土地利用、施工区域内植被破坏、水域、陆域动物的扰动，但这种影响是短暂的，施工期已进行了相应的保护措施，现施工期已结束，项目临时占地已按原貌进行恢复和绿化，施工期生态环境影响已逐渐消失。项目建成后不改变该项目所在区域的土地利用类型，不会对区域植物多样性造成影响。

（四）污染源调查结论

1、废水

根据调查，施工废水经集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理后回用于再次机械冲洗，不外排，不会对周围环境造成任何不利影响。

2、废气

根据调查，本项目施工期产生的废气主要是施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘

等。施工机械及运输车辆排放尾气产生量较小，对周围环境影响不大；施工扬尘采取洒水防尘措施，对大气环境影响范围比较小。

3、噪声

根据调查，施工期噪声来自各类施工设备和运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，大多为不连续噪声，主要设备噪声和机械噪声。通过合理安排施工时间、使用低噪声设备、设备减震等降噪措施来减少噪声对环境的影响，采取以上措施后噪声对环境影响很小。

4、固废

据现场调查及访问，本项目施工期间建筑工地实际产生的固体废物为生活垃圾，无工程弃土。生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

因此，项目施工期间各类固体废物得到合理有效地处置，随着施工期的结束，固体废物产生的影响结束，不会对环境产生影响。

（五）环境管理情况

经过调查核实，施工期及运营期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施，未引起环境问题及纠纷。

（六）验收调查结论

通过调查分析，项目在建设及运行过程中，基本执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实；建立健全了各项安全防护措施及管理制度。符合建设项目竣工环境保护验收条件。

（七）建议

（1）建设单位应加强运行期管理；

（2）建议安排专人负责项目运行期的环境管理，建立完善的环境管理制度和环境保护管理档案，提高环境管理质量。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程					建设地址	梅州市梅县区畚江镇						
	行业类别	D4610 自来水生产和供应					建设性质	新建（迁建）√		改建	技改	补办	（划√）	
	设计生产能力	/			建设项目 开工日期	2017年7月3日	实际生产能力	/			投产日期	2019年3月15日		
	投资总概算（万元）	1431.74			环保投资总概算（万元）		10		所占比例（%）		0.7			
	环评审批部门	梅州市生态环境局梅县分局			批准文号		梅县区环审（2017）10号		批准时间		2017年1月13日			
	初步设计审批部门	梅州市梅县区发展和改革局、梅州市梅县区财政局、梅州市梅县区水务局			批准文号		梅县区发改审（2016）148号		批准时间		2016年9月29日			
	环评验收审批部门	/			批准文号		/		批准时间		/			
	环保设施设计单位	/			环保设施施工单位		/		环保设施监测单位		/			
	实际总投资（万元）	1023.19			实际环保投资（万元）		8		所占比例（%）		0.78			
	废水治理（万元）	2	废气治理（万元）	2	噪声治理（万元）	1	固废治理（万元）	1	绿化及生态（万元）	2	其他	—		
新增废水处理设施能力	—			新增废气处理设施能力		—		年平均工作时		8760小时				
建设单位	梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心			邮政编码	514000	联系电话	刘文健 19926196010		环评单位		广东志华环保科技有限公司			
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新代老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）	
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	其它特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件 1 委托书

委托书

广东汇嘉源工程管理咨询有限公司：

我单位梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目建设已经竣工。依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等文件要求，现委托贵公司对该项目进行环保竣工验收报告的编制。

建设单位（盖章）：梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心

2025 年 3 月

梅州市梅县区环境保护局

梅县区环审[2017]10号

梅州市梅县区环境保护局关于梅县区 村村通自来水工程—畚江镇工程项目 环境影响报告表的批复

梅县农村饮水安全项目建设管理中心：

你单位报来的《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于梅县区畚江镇的松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村。项目主要建设内容为敷设输配水管网 103706 米，新建进水池 2 座，蓄水池 1 座。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

三、项目应重点做好如下环境保护工作：

（一）施工期间应严格控制周围水体产生石油类污染现象的发生。施工废水经处理后回用于场地抑尘，生活废水依

托当地农村污水处理设施处理达标后回用于农田灌溉。废水排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准。

(二)加强对施工场地、堆场、运输车辆的管理,尽量减轻无组织扬尘对周围环境的影响。废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

(三)合理布局施工机械,安排好作业时间,通过选用低噪声设备、设置隔声屏障等措施,确保施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)落实固体废弃物的综合利用和处理处置措施,设置规范的废渣储存设施,防止造成二次污染。余泥渣土运往指定的弃渣场处置;建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场处理;施工人员生活垃圾应集中堆放,交由环卫部门处理。运营期产生的沉淀泥沙经压滤后填埋处理,维护过程产生的废料交有资质单位回收处理。

(五)加强生态环境保护,落实水土流失防治措施。

四、项目环保投资应纳入工程投资预算并予以落实。

五、报告表经批准后,若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变化,你单位应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我局申请项目竣工环境保护验收。

梅州市梅县区环境保护局

2017年1月13日

公开方式：主动公开

抄送：广东志华环保科技有限公司。

梅州市梅县区环境保护局办公室

2017年1月13日印发

- 3 -

附件3 梅州市梅县区发展和改革局、财政局、水务局关于梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告的批复

**梅州市梅县区发展和改革局
梅州市梅县区财政局 文件
梅州市梅县区水务局**

梅县区发改审[2016]148号

梅州市梅县区发展和改革局、财政局、水务局关于梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告的批复

梅县农村饮水安全项目建设管理中心：

你单位报来由广州市水务规划勘测设计研究院编制的《梅州市梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告》及有关图纸等资料已收悉。2016年8月30日梅县区水务局组织召开了专家评审会，对梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告进行了专家评审，并进行了修改完善，专家组一致认为梅县区畚江镇村村通自来水工程初步设计报告基本能按照《广东省村村通自来水工程设计指引》要求设计，基本能达到初步设计的深度要求。经研究同意畚江镇村村通自来水工程建设，该工程包含畚江工业园区自来水厂扩网供水4个村、畚江农饮自来水厂扩网供水7个村、径心村和叶华村进行水厂及管网改造等4宗项目建设。原则上同意专家组审查意见。

梅县区畲江镇松林、咸和等 13 个村的村村通自来水工程已列入《广东省村村通自来水工程建设规划（2012-2020 年）》和《广东省水利厅关于下达村村通自来水工程 2016 年建设任务》的工程建设计划。经区发展改革、财政、水务部门研究，现将你中心上报畲江镇村村通自来水工程的初步设计批复给你们，请遵照执行。

请你中心务必对梅州市梅县区畲江镇村村通自来水工程建设的高度重视，工程建设过程中，进一步强化工作责任的落实，严格按基本建设程序办事，实行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，严把工程质量和施工安全关，进一步加强资金使用的规范管理，确保工程质量和安全，使工程发挥应有的效益。

梅州市梅县区畲江镇村村通自来水工程的批复意见详见附件。

附件：关于梅州市梅县区畲江镇村村通自来水工程初步设计的
批复



抄送：梅州市水务局，广州市水务规划勘测设计研究院

（共印 15 份）

附件3 专家意见及签名

梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程 竣工环境保护验收意见

2025年4月27日，梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心根据《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程竣工环境保护自主验收会，现场验收检查组成员由梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心（建设单位）、广东汇嘉源工程管理咨询有限公司（验收报告编制单位）和专业技术专家组成。验收组听取了建设单位对项目建设情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，查阅了验收报告和相关资料，经认真研究讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

畚江镇地处梅县西南部，辖区面积175平方公里。随着居民生活水平的提高，个人用水量明显增加，供水工程尚未覆盖的区域亦急切渴望自来水通水，因此原有供水工程已不能满足畚江镇发展的要求。为尽快解决畚江镇居民生活饮用水难题，梅县农村饮水安全项目建设管理中心投资建设“梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程”（下称本项目）。本项目建设内容主要为敷设输配水管网116364m，解决畚江镇松林村、咸和村、杉里村、双溪村、中坑村、太湖村、新化村、双龙村、官铺村、成山村、双螺村、叶华村、径心村区域的自来水供水。

梅县农村饮水安全项目建设管理中心于2016年10月委托广东志华环保科技有限公司编制了《梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程建设项目环境影响报告表》，并于2017年1月13日取得了梅州市生态环境局梅县分局（原梅州市梅县区环境保护局）《关于梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审〔2017〕10号）。

经核查，本项目原建设单位为梅县农村饮水安全项目建设管理中心，在项目建设推进过程中，由于为了融资贷款，建设单位发生变更。现建设单位已变更为梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心。

梅县区村村通自来水工程—畚江镇工程于2017年7月3日开工建设，于2019年3月15日完工。

二、工程变更情况

项目实际建设工程规模按规划设计方案实施建设，与环评报告及批复文件要求相比，工程投资及工程量在建设中根据实际情况有所调整，但是以上变更内容不属于重大变更。

三、环境保护措施落实情况

（一）施工废水

本项目工作人员食宿均依托周边生活设施，项目范围内不产生生活污水，项目施工期产生的废水主要为施工废水。施工废水经集中收集后进入隔油池和沉淀池进行处理后回用于再次机械冲洗，不外排，不会对周围环境造成任何不利影响。据调查，施工期未收到施工废水污染投诉。

（二）施工废气

本项目施工期产生的废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，建设单位在施工阶段采取以下防护措施：

①对施工场地应经常洒水，防止扬尘；开挖、钻孔和拆迁过程中应洒水，以使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘，防止粉尘飞扬污染周围空气环境。

②加强交通运输管理，运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装卸前先冲洗干净，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。

③运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘。

据调查，施工期未收到施工废气污染投诉。

（三）施工噪声

施工期噪声来源于施工机械设备的运转及交通运输。本项目选用低噪声设备、减低设备运行噪声、合理安排噪声污染严重的设备的施工时间、暂不使用的设备立即关停等措施降噪，对周围环境的影响不大。据调查，施工期未收到施工噪声污染投诉。

（四）施工固体废物

根据现场调查及访问，本项目施工期间建筑工地实际产生的固体废物为生活垃圾，无工程弃土。本项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门转运处理。本项目施工过程中所产生的固体废物不会直接向环境排放，且随着施工期的结束，这种影响也随之结束，不会对

周围环境产生明显影响。据调查，施工期未收到固体废物污染投诉。

（五）施工期生态环境保护措施

项目不涉及新增占地，施工时破坏的项目所在地及周边土壤结构通过施工结束后采取的植树种草等措施恢复原有面貌；工程施工临时场地布置和作业带占用和破坏一定面积的陆生植被通过工程完工清理及人工补植后自然恢复；施工期对底栖动物及陆生动物的影响通过工程结束后消失；施工单位在施工期做好项目所在区域水土保持措施。采取以上措施后对施工对项目所在区域的生态环境影响不大。据调查，施工期未收到生态环境污染投诉。

四、工程建设对环境的影响

项目实施后，项目附近水环境良好，水体顺畅，土壤、植被复绿较好，未破坏生态环境。

五、验收结论和建议

（一）验收结论

通过调查分析，项目在建设及运行过程中，基本执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实；建立健全了各项安全防护措施及管理制度。符合建设项目竣工环境保护验收条件。

（二）专家建议和要求

- （1）建设单位应加强运行期管理；
- （2）建议安排专人负责项目运行期的环境管理，建立完善的环境管理制度和环境保护管理档案，提高环境管理质量。

六、其他

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收组意见、验收调查表和验收检查组要求的补充说明等相关材料在公司公示栏和公众网站上进行公示；建设单位公开上述信息同时，向所在地县级以上生态环境部门报送相关信息，并接受监督检查。

梅州市梅县区村村通自来水工程建设管理中心

2025年4月27日

**梅县区村村通自来水工程—畲江镇工程
竣工环境保护验收组成员**

姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	签名
刘文健	梅州市梅县区村村通 自来水工程建设管理 中心	工程师	19926196010	刘文健
房剑红	梅州市环境技术中心	高工	19128192695	房剑红
张丰如	嘉应学院	副教授	13719951849	张丰如
温丙奎	嘉应学院	注册环评工 程师	13421033730	温丙奎
曾志玲	广东汇嘉源工程管理 咨询有限公司	/	13631256382	曾志玲

附图 1 项目地理位置图



附图 2 平面布置图

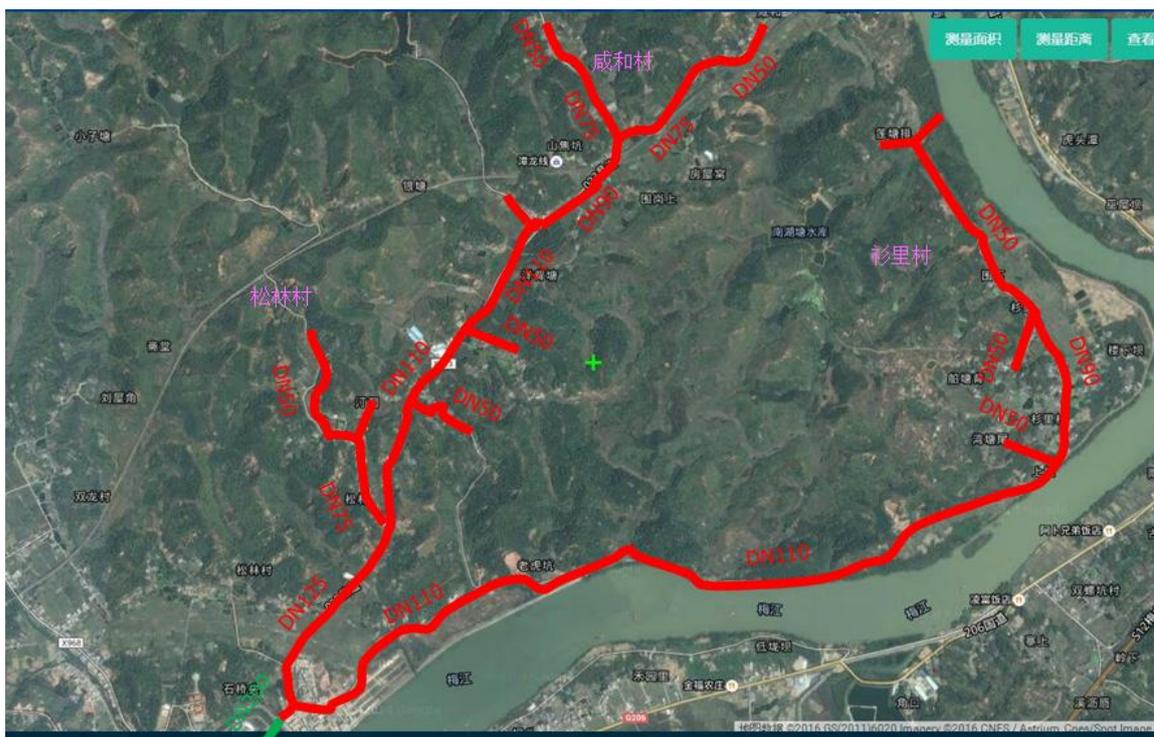


图 2-1 双林、咸和、杉里村工程布置图

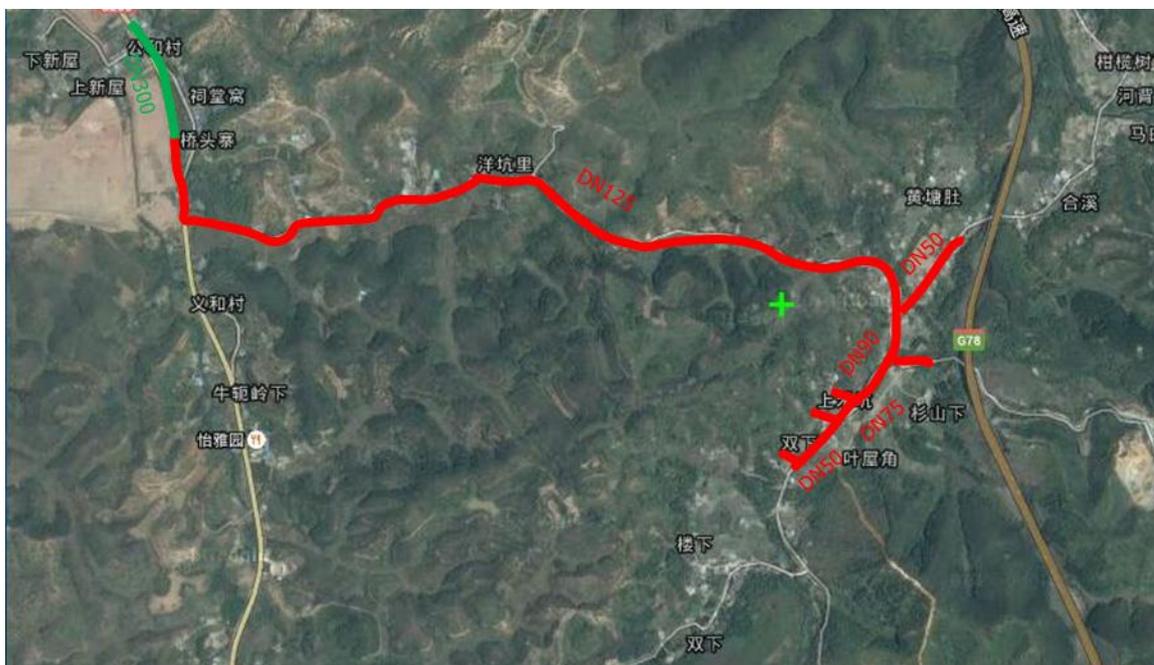


图 2-2 双溪村工程布置图

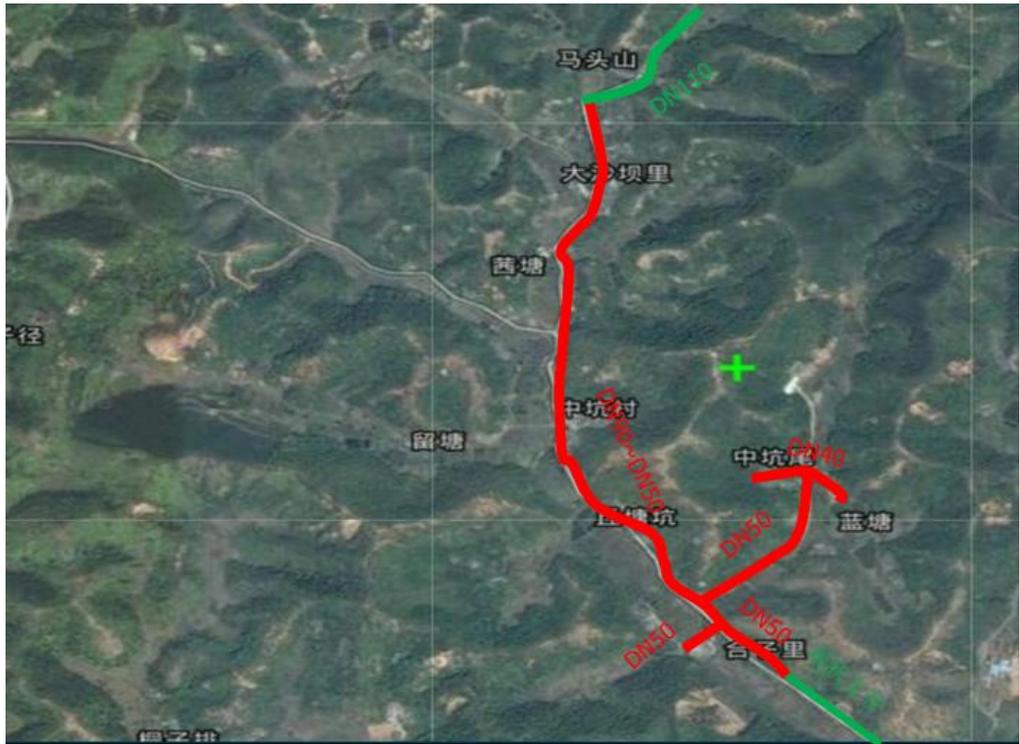


图 2-3 中坑村工程布置图

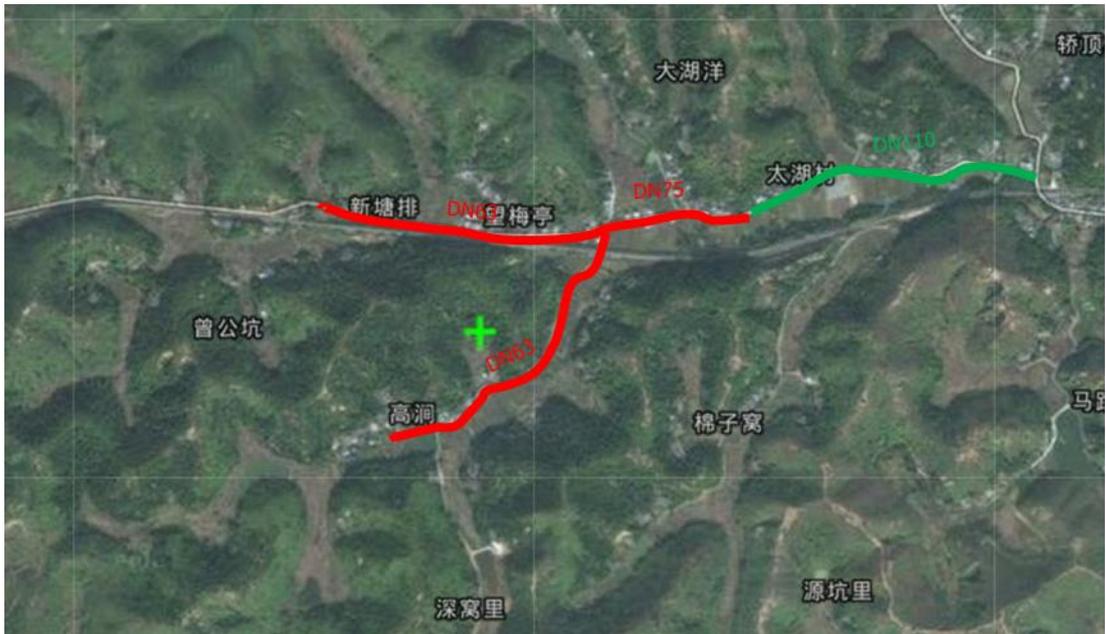


图 2-4 太湖村工程布置图



图 2-5 新化村工程布置图

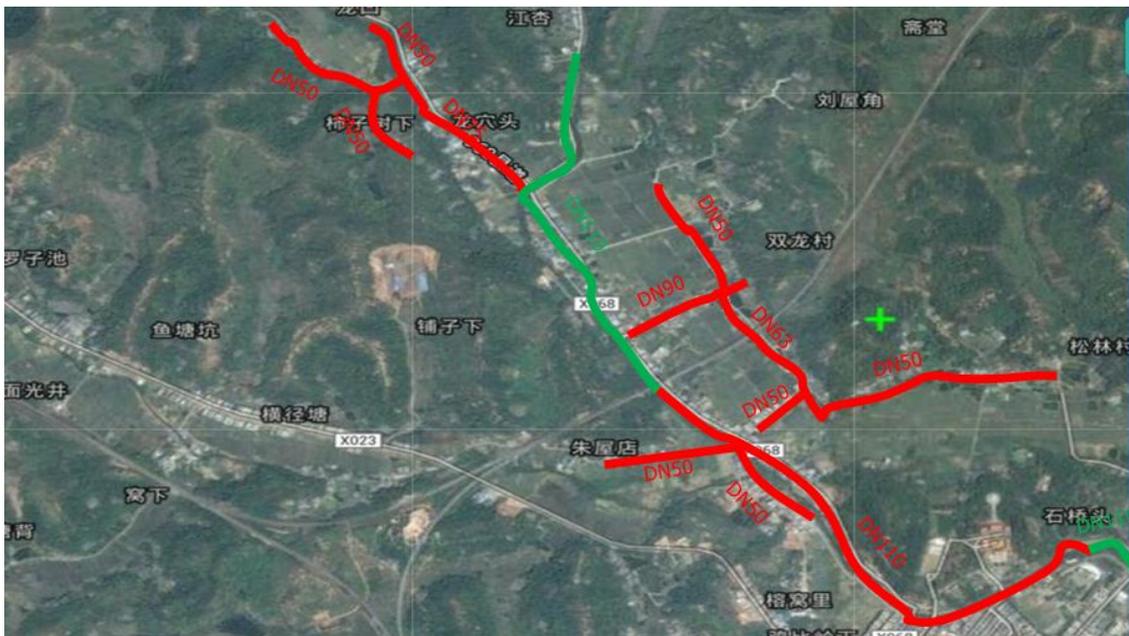


图 2-6 双龙村工程布置图



图 2-7 官铺村工程布置图

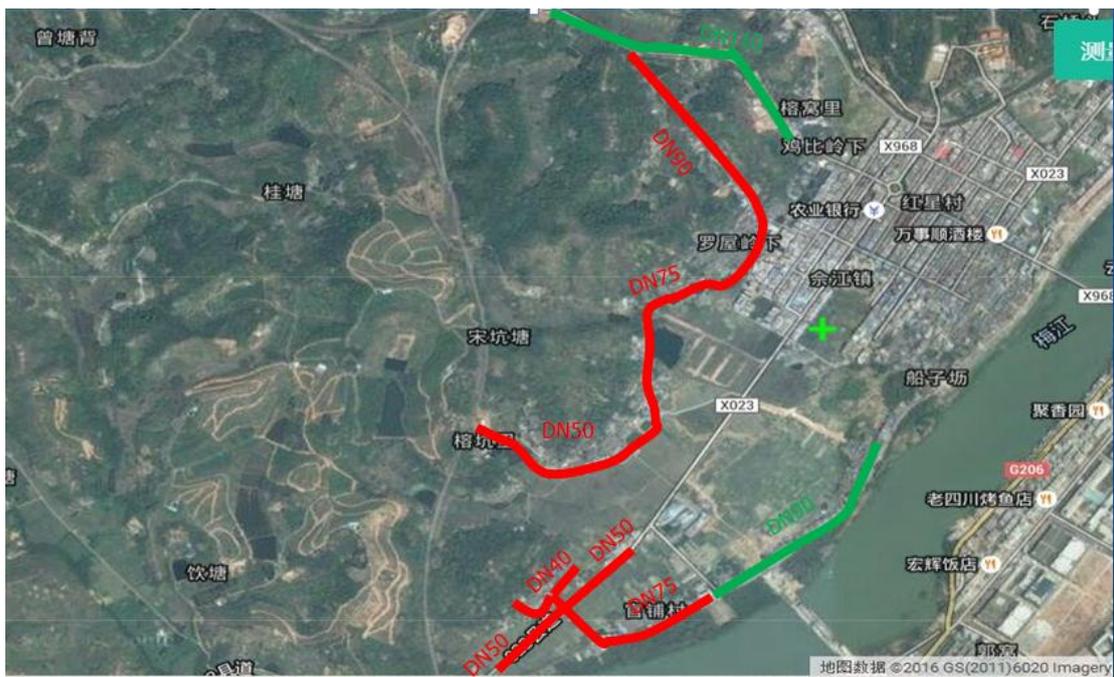


图 2-8 成山村、双螺村村工程布置图

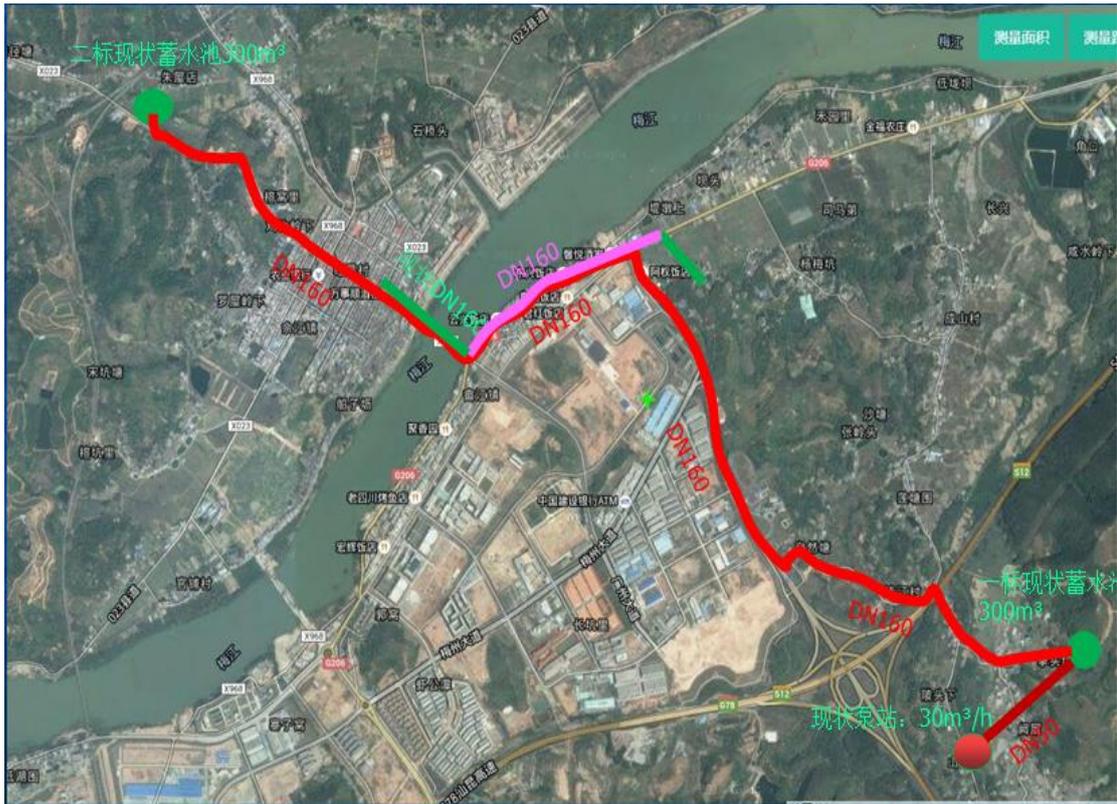


图 2-9 水池补充片区工程布置图

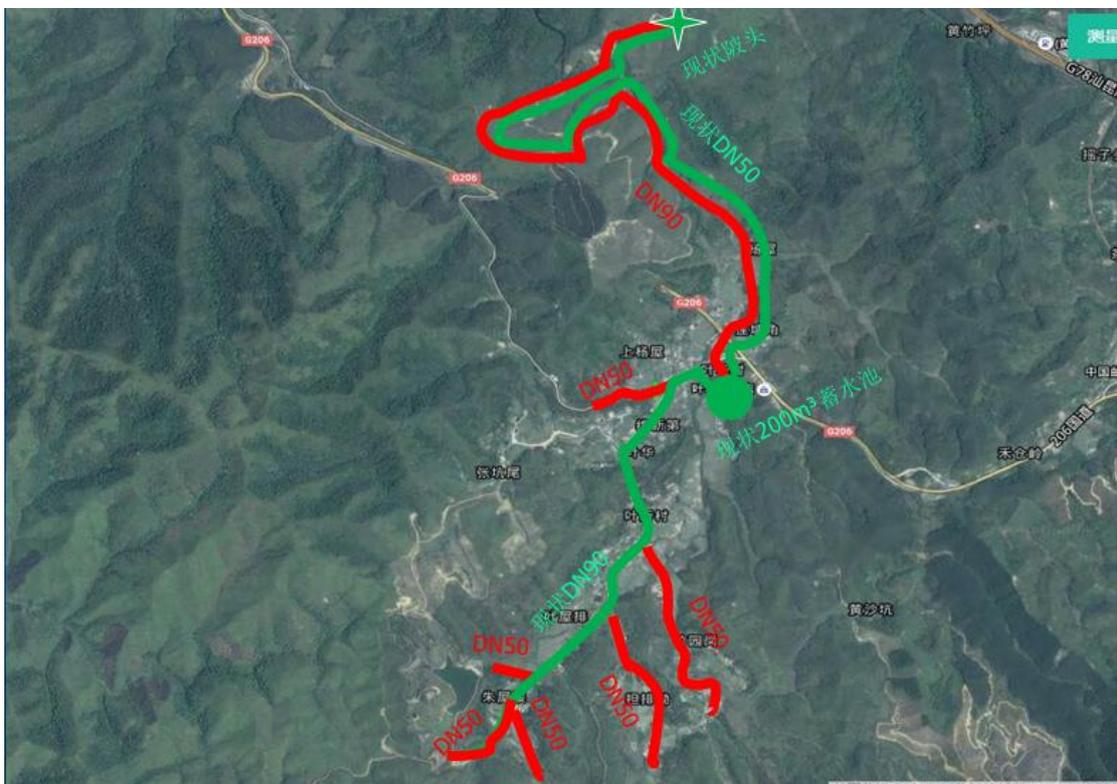


图 2-10 叶华村工程布置图

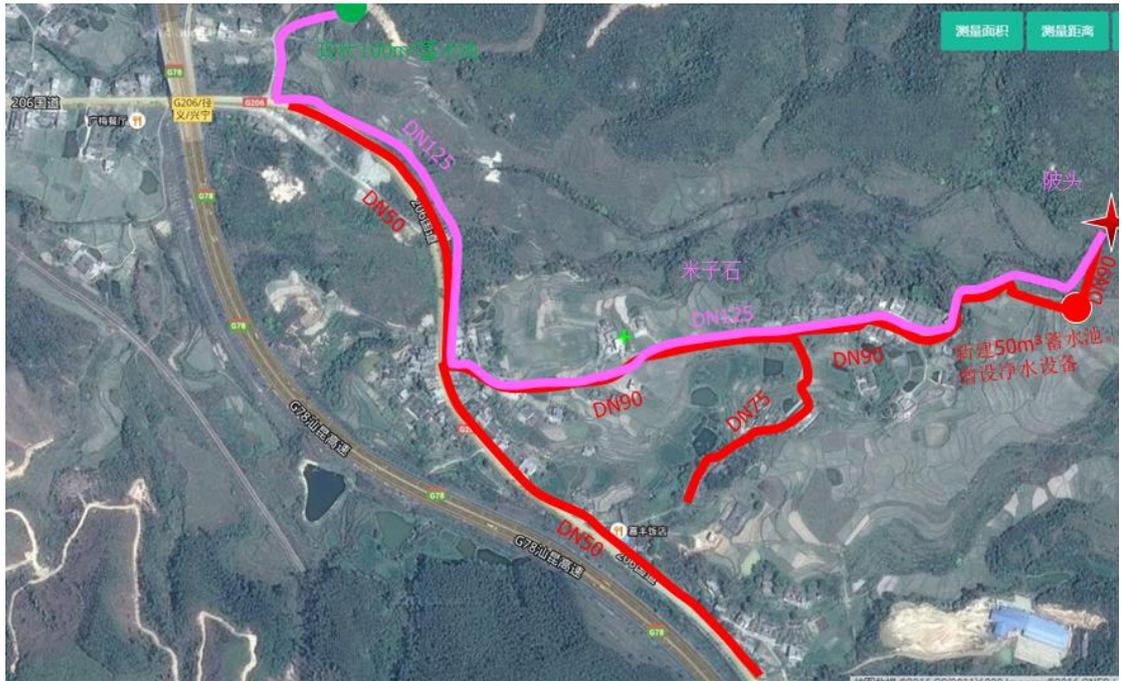


图 2-11 径心村工程布置图

附图 3 现场情况图



径心村供水站



叶华村供水站
